

尾張北部環境組合だより

令和7年1月 第14号

発行・編集 尾張北部環境組合

〒483-8221

江南市赤童子町大堀 90 番地（江南市役所内）

TEL 0587-54-1188

尾張北部環境組合は、犬山市・江南市・大口町・扶桑町のごみを共同で処理する、新たなごみ処理施設の整備を推進しています。

新ごみ処理施設の建設工事を進めています

組合では、令和10年4月の供用開始に向けて、三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社中部支店を代表企業とするグループと「ごみ処理施設建設工事請負契約」を締結し、建設工事を進めています。

令和6年度は、土地造成工事として盛土及びコンクリート擁壁の設置、大雨が降った際に雨水を一時的に貯留し敷地外への流出を抑制する雨水調整池の整備を進めています。また、土地造成工事と並行して、土木建築工事を順次進めていきます。今年度は、建物の中で最も深い位置となるごみピット部分の掘削工事を行います。

さらに、関連工事として、施設への出入路となる建設地南側に隣接する一般県道浅井犬山線の右折レーン整備工事に着手しました。工事期間は、令和6年度から令和8年度を予定しています。本関連工事に伴い、県道北側歩道の通行止め及び車道片側交互通行規制を行うことがあります。

工事期間中は、周辺道路を工事の関係車両が通行することになりますが、安全には十分配慮していきます。通行される方や周辺にお住まいの皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

建設地東側上空より撮影



雨水調整池の整備状況



建設地の状況（令和6年10月末時点）

事業工程

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
施設詳細設計	→	→				
準備工事 (伐採)	→	□文化財保護法に基づく試掘調査（江南市）				
土地造成工事		→				
土木建築工事		▼令和6年12月着手	→	→	→	
プラント工事			▼令和7年12月着手	→	→	
試運転				令和9年11月頃▼	→	
運営期間				令和10年4月供用開始▼	→	→

工事進捗のホームページはこちら

工事の進捗状況をお知らせしています。

進捗状況の更新は、毎月月末を予定しています。


URL : <https://owarihokubu.com/>



スマートフォン・携帯電話からはこちらのQRコードを読み取りしてアクセスできます

令和5年度尾張北部環境組合一般会計歳入歳出決算

構成市町（犬山市・江南市・大口町・扶桑町）からの分担金及び負担金を主な財源として、事業を実施しました。歳出予算のうち、2,193万3,000円は令和6年度へ繰越明許費による繰り越しを行いました。また、歳入歳出差引残額である480万3,508円は令和6年度へ繰り越されます。

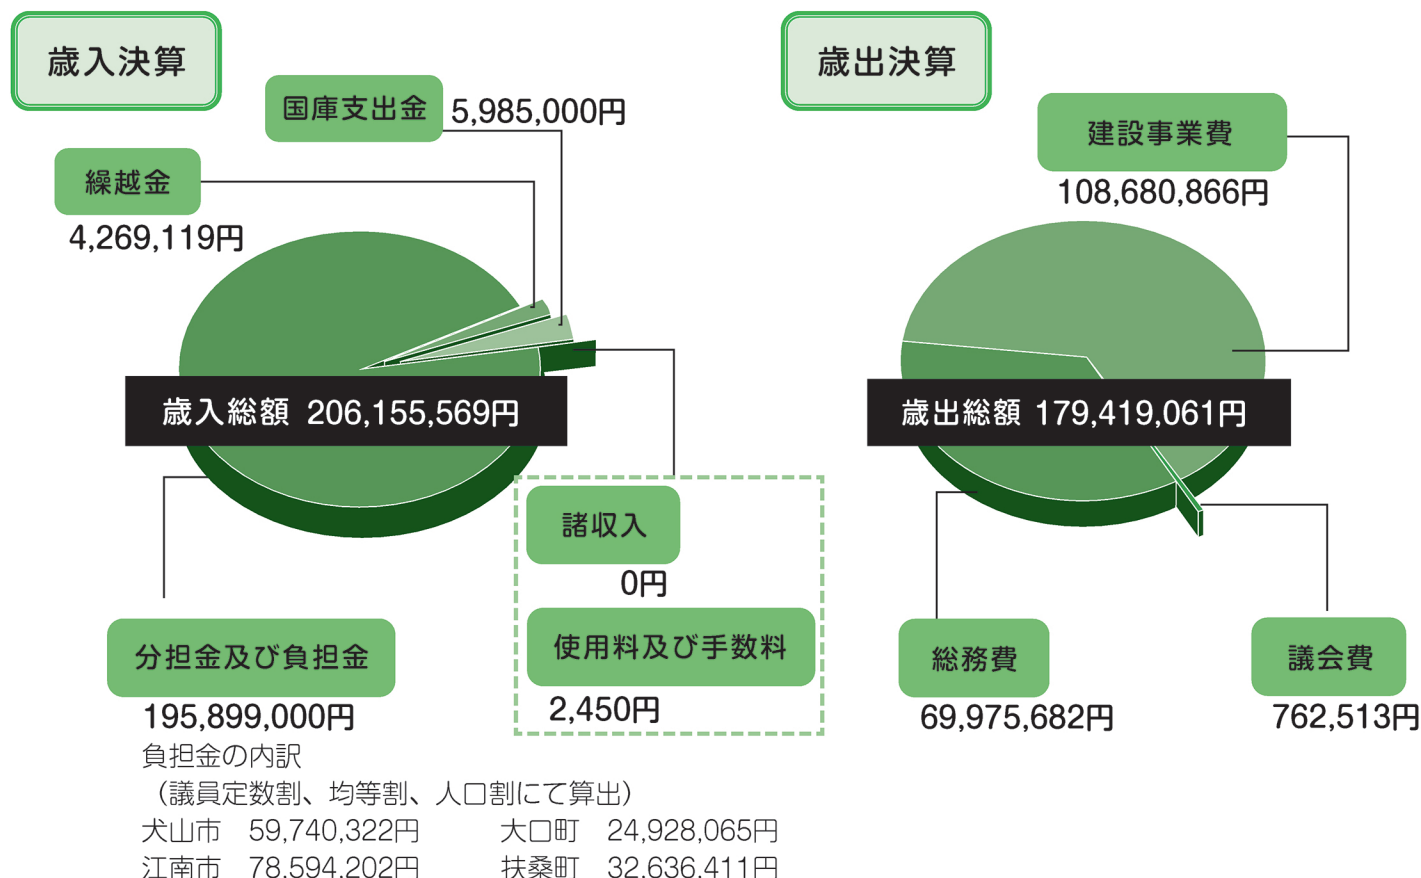

主な事業内容

●環境影響評価事後調査業務

建設地内に営巣しているホンドキツネについて、環境保全措置の効果及び生息状況の確認を目的として、自動撮影カメラの設置と現地踏査を実施しました。また、ホンドキツネ及び餌生物の生息場所である河川敷を対象に、ホンドキツネの生息環境保全につながるよう関係機関と協議し、チラシ等を作成・設置しました。

●ごみ処理施設整備工事

ごみ処理施設の基本設計及び実施設計、準備工事として事業地内の樹木伐採・伐根、工作物（残置物）の撤去を行いました。

●設計・施工監理業務

ごみ処理施設の設計・建設工事について、経済的、安定的かつ継続的に実施されることを目的として、事業者から提出された実施設計図書や施工内容に対して、入札公告時の資料・契約図書及び入札時に事業者から提出された提案書に基づく審査を行いました。また、定期的な設計会議や工事現場での立会・検査を通じて、工事が適正に施工されているか、国から補助を受ける交付金事業として適正に執行されているかの監理を行いました。さらに、これらの設計・施工監理の履歴として取りまとめた監理日誌を含む業務報告書の作成を行いました。
